9- Planejamento Ágil

Planejamento Ágil

1. Introdução ao Planejamento Ágil

O **Planejamento Ágil** é uma abordagem de organização do trabalho que permite desenvolver produtos e projetos de maneira incremental, colaborativa e adaptável. Em vez de definir todos os detalhes do projeto no início e seguir um plano rígido, a equipe planeja o trabalho em ciclos curtos, entrega resultados frequentemente e ajusta suas prioridades de acordo com o feedback recebido.

Essa abordagem é muito utilizada no desenvolvimento de software, mas também pode ser aplicada em projetos de marketing, gestão de produtos, operações e outras áreas.

Os principais objetivos do planejamento ágil são:

- **Entregar valor continuamente:** priorizar funcionalidades que tragam benefícios reais ao cliente.
- **Adaptar-se às mudanças:** revisar planos conforme novas necessidades surgem.
- **Melhorar a previsibilidade:** utilizar dados das entregas anteriores para estimar o trabalho futuro.
- **Promover colaboração:** envolver as pessoas responsáveis pelo produto e pela execução.
- **Reduzir riscos:** identificar problemas antecipadamente e validar as entregas em etapas menores.

1.1. Planejamento tradicional versus planejamento ágil

Planejamento tradicional	**Planejamento ágil**
Busca definir grande parte do projeto antecipadamente.	Planeja continuamente, em diferentes níveis.
Mudanças podem exigir revisões extensas do plano.	Mudanças são avaliadas e incorporadas de forma controlada.
A entrega costuma ocorrer ao final de fases ou do projeto.	Entregas de valor podem ocorrer a cada iteração.

Estimativas frequentemente se baseiam em horas e prazos fixos.	Pode utilizar Story Points, velocidade e outras métricas.
O sucesso é frequentemente avaliado pelo cumprimento do plano.	Valor entregue, qualidade, resultados e capacidade de adaptação também são considerados.

É importante destacar que o planejamento ágil não significa ausência de planejamento. Significa planejar continuamente, utilizando informações atualizadas para tomar decisões melhores.

2.3. O que é uma Sprint?

Uma Sprint é um período de duração fixa de **um mês ou menos**, durante o qual a equipe trabalha para atingir um objetivo e produzir um incremento de valor.

É comum utilizar Sprints de uma, duas ou três semanas. A duração deve ser adequada ao contexto do produto e manter uma cadência consistente.

Uma Sprint pode envolver:

1. Sprint Planning — planejamento da Sprint.
2. Daily Scrum — acompanhamento diário do progresso pelos Developers.
3. Trabalho de desenvolvimento, testes e integração.
4. Sprint Review — inspeção do resultado e discussão de adaptações futuras.
5. Sprint Retrospective — identificação de melhorias no processo de trabalho.

A Sprint Planning inicia a Sprint, e a Sprint Retrospective a encerra. O trabalho de desenvolvimento acontece ao longo de todo o ciclo.

3. Sprint Planning: planejamento da Sprint

O **Sprint Planning** é o evento do Scrum que define por que a Sprint é importante, o que pode ser realizado e como o trabalho será executado.

É o momento em que o Scrum Team estabelece uma direção comum para a próxima Sprint. O evento não deve ser apenas uma distribuição de tarefas: ele precisa promover entendimento compartilhado sobre o objetivo e o trabalho necessário.

3.1. Objetivos do Sprint Planning

O planejamento da Sprint procura responder a três perguntas essenciais:

- **Por que esta Sprint é valiosa?** Define-se o Sprint Goal.
- **O que pode ser concluído nesta Sprint?** Selecionam-se os itens do Product Backlog.
- **Como o trabalho escolhido será realizado?** Desenvolve-se o plano de execução.

As três respostas devem estar conectadas. Selecionar muitas tarefas sem um objetivo claro pode resultar em uma Sprint ocupada, mas sem uma entrega coerente de valor.

3.2. Quem participa?

Participam do Sprint Planning o Product Owner, o Scrum Master e os Developers.

- O Product Owner apresenta as prioridades, o valor esperado e os itens mais relevantes do Product Backlog.
- Os Developers avaliam a capacidade disponível, esclarecem dúvidas, selecionam o trabalho que consideram viável e planejam sua execução.
- O Scrum Master ajuda a garantir que o evento seja compreendido e produtivo, facilitando o processo quando necessário.

O planejamento deve ser colaborativo. O Product Owner não deve simplesmente impor uma lista de tarefas, e a equipe não deve selecionar itens sem compreender o objetivo de negócio.

3.3. Como realizar um Sprint Planning passo a passo

Etapa 1 — Definir o objetivo da Sprint

Identificar o resultado que trará valor ao produto. O objetivo deve ser claro, compreensível e permitir alguma flexibilidade na escolha das soluções.

Etapa 2 — Analisar o Product Backlog

Revisar os itens prioritários, critérios de aceitação, dependências, riscos e dúvidas. Itens bem refinados facilitam a tomada de decisão.

Etapa 3 — Avaliar a capacidade da equipe

Considerar férias, feriados, reuniões, suporte, atividades paralelas, experiência da equipe e resultados de Sprints anteriores.

Etapa 4 — Selecionar os itens da Sprint

Os Developers selecionam, em colaboração com o Product Owner, os itens que podem ser concluídos considerando o objetivo e a capacidade disponível.

Etapa 5 — Criar o plano de execução

Identificar atividades técnicas, testes, integrações, dependências e riscos. Decompor os itens em tarefas pode ajudar, mas não precisa resultar em um plano imutável.

Etapa 6 — Confirmar o entendimento

Verificar se todos compreendem o Sprint Goal, os itens selecionados, a estratégia de execução e a Definition of Done.

3.4. Duração do Sprint Planning

No Scrum Guide, para uma Sprint de um mês, o Sprint Planning tem duração máxima de oito horas. Para Sprints menores, o evento normalmente é mais curto.

Por exemplo, uma equipe com Sprints de duas semanas pode realizar um planejamento de duas a quatro horas, dependendo da complexidade do produto, da preparação do backlog e da experiência do time. Esse intervalo é uma referência prática, não uma regra oficial do Scrum.

3.5. Exemplo prático de Sprint Planning

Imagine uma equipe que desenvolve um aplicativo de vendas. O objetivo é facilitar a compra de produtos.

O Product Backlog contém os seguintes itens:

Item	Funcionalidade	Prioridade
US01	Consultar catálogo de produtos	Alta
US02	Adicionar produto ao carrinho	Alta
US03	Calcular o frete	Média
US04	Aplicar cupom de desconto	Média
US05	Criar lista de desejos	Baixa

A equipe decide trabalhar no objetivo: **permitir que o usuário selecione produtos e prepare seu carrinho de compras**.

São selecionadas as histórias de catálogo e carrinho, desde que sejam viáveis e possam atender à Definition of Done. O cálculo do frete poderá ficar para uma Sprint posterior, caso não seja necessário para atingir o objetivo atual.

O resultado do planejamento deve conter:

- Um Sprint Goal claro.
- Os itens selecionados para a Sprint.
- Um plano inicial de implementação.
- Os riscos e as dependências identificados.
- O entendimento compartilhado sobre o que significa concluir o trabalho.

Ponto importante: o escopo pode ser renegociado durante a Sprint entre os Developers e o Product Owner, desde que isso não coloque o Sprint Goal em risco. A qualidade não deve ser reduzida para simular uma entrega concluída.

4. Story Points: estimativa relativa do esforço

Story Points são uma unidade relativa utilizada por equipes ágeis para estimar o tamanho de um item do Product Backlog, como uma User Story.

Em vez de tentar prever exatamente quantas horas serão necessárias, a equipe compara os itens e considera fatores como:

- **Esforço:** quantidade de trabalho envolvida.
- **Complexidade:** dificuldade técnica ou funcional.
- **Incerteza:** falta de informações, requisitos desconhecidos ou soluções ainda não validadas.
- **Risco:** possibilidade de encontrar obstáculos durante a execução.

Story Points não são uma medida universal. Cada equipe desenvolve uma referência própria para estimar o tamanho relativo dos itens.

4.1. Por que utilizar Story Points?

Em projetos de software, prever o tempo exato de uma atividade pode ser difícil, especialmente quando existem integrações, dependências ou requisitos pouco claros.

A estimativa relativa permite que a equipe compare histórias e discuta suas diferenças sem precisar transformar imediatamente cada estimativa em horas.

Por exemplo:

- Uma história simples pode receber 1 ponto.
- Uma história um pouco maior pode receber 2 pontos.
- Uma história com maior complexidade pode receber 5 pontos.
- Uma história muito complexa ou incerta pode receber 13 pontos.

Esses valores são ilustrativos. Uma história de 5 pontos não necessariamente levará cinco horas ou cinco dias para ser concluída.

4.2. Escala de Story Points

Muitas equipes utilizam a sequência de Fibonacci ou uma escala adaptada, como 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21.

1

Muito pequeno

Trabalho simples, conhecido e com poucas dependências.

2

Pequeno

Pouco esforço e baixa incerteza.

3

Moderado

Trabalho relativamente conhecido, com algumas etapas.

5

Médio

Mais etapas, integrações ou complexidade.

8

Grande

Maior esforço, dependências ou incertezas.

13

Muito grande

Item difícil de estimar; pode precisar ser dividido.

A escala de Fibonacci aumenta a distância entre os valores conforme o tamanho cresce. Isso representa a dificuldade de estimar com precisão itens maiores e mais incertos.

Uma equipe também pode utilizar escalas como 0, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. O mais importante é manter uma referência consistente dentro do time.

4.3. Como estimar Story Points na prática

Considere as seguintes histórias de usuário de um aplicativo:

User Story	**Estimativa ilustrativa**	**Justificativa**
Exibir o nome e o preço de um produto	1	Funcionalidade simples e conhecida.
Filtrar produtos por categoria	3	Exige regras de filtragem e testes.
Implementar carrinho com atualização de quantidades	5	Envolve regras de negócio, estado e validações.
Integrar pagamentos com um provedor externo	8	Pode envolver segurança, integração, erros e homologação.
Criar uma solução de recomendação personalizada ainda não validada	13	Alta incerteza técnica e funcional.

Os números servem para demonstrar o raciocínio. Uma equipe real pode atribuir outros valores após discutir os requisitos, a arquitetura e sua experiência anterior.

4.4. Story Points não são horas

Essa é uma das distinções mais importantes do planejamento ágil.

Story Points	**Horas**
Estimam tamanho relativo.	Medem ou estimam duração do trabalho.
Consideram esforço, complexidade e incerteza.	Representam tempo de execução.
São interpretados com base nas referências da equipe.	Podem ser registrados em horas ou frações de hora.
Não devem ser convertidos automaticamente em tempo.	Dependem das condições reais de trabalho.

Uma equipe não deve afirmar que um ponto equivale a quatro horas de maneira universal. Mesmo que exista uma correlação histórica em determinado contexto, ela não constitui uma regra geral nem garante previsões futuras.

4.5. Benefícios e limitações dos Story Points

Benefícios:

- Facilitam comparações entre itens.
- Estimulam discussões sobre complexidade e riscos.
- Ajudam a observar a capacidade histórica da equipe.
- Contribuem para estimar o volume provável de trabalho futuro.

Limitações:

- Dependem do entendimento compartilhado da equipe.
- Podem variar quando a composição ou a experiência do time muda.
- Não garantem a conclusão de uma quantidade fixa de trabalho.
- Podem ser mal utilizados quando se tornam metas individuais de produtividade.

Story Points não devem ser usados para comparar diretamente o desempenho de equipes diferentes, porque cada equipe possui suas próprias referências e condições de trabalho.


5. Planning Poker: técnica colaborativa de estimativa

O **Planning Poker** é uma técnica de estimativa coletiva usada para atribuir Story Points aos itens do Product Backlog. Ela combina julgamento individual, discussão em grupo e consenso para reduzir a influência de opiniões dominantes.

A técnica é especialmente útil quando os itens apresentam incertezas e precisam ser compreendidos por diferentes profissionais da equipe.





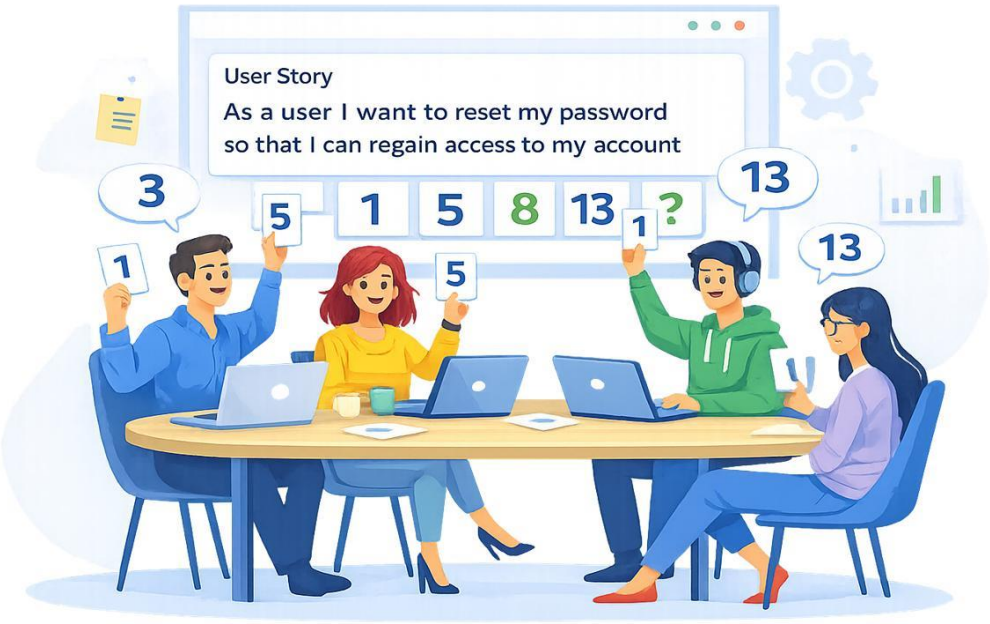

5.1. Como funciona o Planning Poker?

Cada participante recebe um conjunto de cartas com valores de estimativa, geralmente baseados na sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 e valores adicionais, conforme a escala escolhida.

O processo normalmente segue estas etapas:

1. **Apresentação da história:** o Product Owner ou responsável pelo refinamento explica a necessidade, os critérios de aceitação e o valor esperado.
2. **Esclarecimento de dúvidas:** os participantes discutem regras de negócio, restrições técnicas, dependências e riscos.
3. **Estimativa individual:** cada participante escolhe uma carta sem revelar sua estimativa aos demais.
4. **Revelação simultânea:** todos mostram suas cartas ao mesmo tempo, reduzindo a influência das primeiras opiniões apresentadas.
5. **Discussão das diferenças:** participantes com estimativas mais altas e mais baixas explicam seu raciocínio.
6. **Nova rodada:** depois de esclarecer as diferenças, a equipe realiza outra estimativa, se necessário.
7. **Registro da estimativa:** a equipe registra um valor consensual ou uma decisão suficientemente compartilhada para prosseguir.

O Planning Poker não exige unanimidade matemática em todos os casos. O objetivo é desenvolver entendimento comum sobre o tamanho relativo do trabalho.

5.2. Exemplo prático de Planning Poker

Uma equipe precisa estimar a história:

Como cliente, quero adicionar produtos ao carrinho para poder comprá-los posteriormente.

Na primeira rodada, quatro participantes apresentam as seguintes estimativas:

Desenvolvedor A

3

Desenvolvedor B

8

Profissional de testes

5

Desenvolvedor C

5

As estimativas variam de 3 a 8 pontos. Em vez de calcular simplesmente a média, a equipe investiga as razões dessa diferença.

- Quem estimou 3 pontos acredita que o carrinho utilizará componentes já existentes.
- Quem estimou 8 pontos identificou possíveis problemas de persistência, atualização de quantidades e integração com o estoque.
- Quem estimou 5 pontos considera que o escopo é viável, mas exige validações adicionais.

Após a discussão, a equipe percebe que a persistência do carrinho ainda não está definida. O grupo esclarece o requisito e realiza uma nova rodada. Supondo que haja consenso em 5 pontos, esse será o valor registrado.

Aprendizado: a maior contribuição do Planning Poker não é o número final, mas a descoberta de informações, riscos e diferentes interpretações da história.

5.3. Vantagens do Planning Poker

- Reduz a influência de participantes mais dominantes.
- Incentiva a participação de profissionais com diferentes especialidades.
- Ajuda a identificar requisitos incompletos.
- Promove conhecimento compartilhado sobre o produto.
- Permite discutir riscos antes de assumir compromissos de trabalho.

5.4. Boas práticas

- Refinar os itens antes da reunião de estimativa.

- Explicar os critérios de aceitação com clareza.
- Evitar que a estimativa de uma pessoa influencie as demais antes da revelação.
- Investigar diferenças significativas, sem discutir apenas para defender um número.
- Dividir histórias excessivamente grandes ou incertas.
- Não usar os pontos para pressionar a equipe a produzir mais.

O Planning Poker pode ser realizado presencialmente com cartas físicas ou remotamente com ferramentas de colaboração.

6. Planejamento de Sprint

O planejamento de Sprint é o processo mais amplo de preparação e organização do trabalho que será realizado durante uma iteração. No Scrum, o evento formal que inicia essa etapa é o Sprint Planning.

Para fins de estudo, é útil diferenciar o evento de planejamento do trabalho contínuo de preparação que o antecede.

6.1. O que deve estar preparado antes da reunião?

A equipe pode realizar atividades de refinamento do Product Backlog para facilitar o Sprint Planning:

- Entender as necessidades dos usuários.
- Revisar e ordenar os itens prioritários.
- Definir critérios de aceitação.
- Identificar dependências e riscos.
- Dividir itens grandes em histórias menores.
- Estimar os itens, quando isso for útil para a tomada de decisão.

O refinamento do Product Backlog é uma atividade contínua, não um evento formal do Scrum com duração fixa.

6.2. Capacidade da equipe e seleção do trabalho

A capacidade representa as condições reais que a equipe terá para trabalhar durante a Sprint. Não significa simplesmente multiplicar o número de pessoas pelos dias do período.

Considere uma equipe com cinco profissionais e uma Sprint de dez dias úteis. O total teórico é de 50 pessoas-dias, mas férias, feriados, suporte, reuniões e outras responsabilidades reduzem o tempo disponível para o trabalho planejado.

Por isso, a equipe deve combinar a avaliação de capacidade com o histórico de entrega e a complexidade dos itens.

6.3. Exemplo de planejamento com velocidade

Imagine que uma equipe concluiu os seguintes volumes de trabalho em três Sprints anteriores:

Sprint	Story Points concluídos
Sprint 1	20
Sprint 2	24
Sprint 3	22

A velocidade média histórica é:

20+24+223=22320+24+22=22

A equipe concluiu, em média, 22 pontos por Sprint.

Esse valor pode servir como referência inicial para discutir a seleção de trabalho na próxima Sprint, mas não representa uma garantia. A equipe ainda precisa considerar sua capacidade atual, as dependências, o Sprint Goal e o contexto dos itens.

Se houver férias, mudanças na equipe ou uma demanda extraordinária de suporte, pode ser adequado selecionar menos trabalho.

6.4. Sprint Goal: o objetivo da Sprint

O Sprint Goal descreve o resultado que a equipe pretende alcançar durante a Sprint. Ele orienta as decisões e mantém a equipe focada em um propósito comum.

Exemplo pouco adequado:

Desenvolver as histórias 1, 2 e 3.

Esse enunciado apenas enumera atividades.

Exemplo mais adequado:

Permitir que novos clientes encontrem produtos e adicionem itens ao carrinho.

Esse objetivo explica o resultado pretendido e permite que a equipe avalie como o trabalho contribui para ele.

6.5. O que acontece durante a Sprint?

Após o planejamento:

- Os Developers executam o trabalho e acompanham o progresso diariamente.
- A equipe inspeciona os resultados e adapta o plano conforme necessário.
- O Product Owner esclarece dúvidas e colabora na negociação do escopo.
- A qualidade é mantida conforme a Definition of Done.

- O Sprint Backlog é atualizado conforme a equipe aprende mais sobre o trabalho.

A Daily Scrum não é uma reunião de prestação de contas ao gerente. É um evento para os Developers inspecionarem o progresso em direção ao Sprint Goal e adaptarem o plano de trabalho.

6.6. Erros comuns no planejamento de Sprint

- Selecionar mais trabalho do que a equipe consegue concluir.
- Confundir estar ocupado com entregar valor.
- Iniciar histórias sem entendimento suficiente dos requisitos.
- Ignorar testes, integração, documentação necessária e critérios de conclusão.
- Transformar Story Points em metas individuais.
- Tratar o Sprint Backlog como um plano imutável.
- Priorizar a quantidade de histórias em vez do resultado da Sprint.

7. Planejamento de Releases

Uma **Release** é a disponibilização de uma versão do produto ou de funcionalidades para usuários, clientes ou outro público definido. O planejamento de releases procura coordenar as entregas ao longo de várias Sprints para alcançar objetivos de negócio.

Diferentemente do Sprint Planning, que organiza o trabalho de uma Sprint específica, o planejamento de releases observa um horizonte mais amplo.

Uma release pode envolver várias Sprints, e uma equipe também pode disponibilizar incrementos menores continuamente, sem precisar esperar o final de uma release formal.

7.1. Objetivos do planejamento de releases

- Definir quais funcionalidades são importantes para uma versão.
- Estabelecer metas e resultados de negócio.
- Estimar quando determinados resultados poderão estar disponíveis.
- Coordenar dependências entre equipes, sistemas e fornecedores.
- Identificar riscos técnicos e operacionais.
- Planejar testes de aceitação, segurança, implantação e comunicação.
- Alinhar expectativas de stakeholders e clientes.

O planejamento de releases deve equilibrar valor, risco, qualidade e previsibilidade. Uma data estimada não deve ser tratada como garantia quando existem incertezas significativas.

7.2. Elementos de um plano de release

Elemento	Descrição
Objetivo da release	Resultado de negócio que se deseja alcançar.
Escopo prioritário	Funcionalidades necessárias para alcançar o objetivo.
Backlog priorizado	Itens organizados segundo valor, risco e dependências.
Estimativas	Tamanho relativo dos itens e capacidade histórica.
Cronograma indicativo	Horizonte provável para a entrega.
Dependências	Integrações, fornecedores, aprovações ou outras equipes.
Critérios de qualidade	Testes, segurança, desempenho e Definition of Done.
Estratégia de implantação	Como disponibilizar a versão, monitorar resultados e responder a problemas.


7.3. Como realizar o planejamento de releases

1. **Definir a visão e o objetivo:** identificar o problema do cliente e o resultado de negócio que a release deve proporcionar.
2. **Priorizar funcionalidades:** ordenar os itens do Product Backlog pelo valor esperado, risco, urgência e dependências.
3. **Estimar o trabalho:** utilizar estimativas relativas e informações sobre a capacidade histórica das equipes.
4. **Projetar cenários:** calcular possibilidades de entrega considerando diferentes velocidades e incertezas, em vez de depender de uma única previsão.
5. **Identificar riscos e dependências:** analisar integrações, segurança, requisitos regulatórios, migrações e necessidades operacionais.
6. **Planejar a disponibilização:** preparar implantação, comunicação, suporte, monitoramento e eventuais estratégias de reversão.
7. **Revisar continuamente:** atualizar o plano após cada Sprint, utilizando o que foi aprendido e os resultados efetivamente obtidos.

7.4. Exemplo prático de planejamento de releases

Imagine que uma empresa esteja desenvolvendo uma plataforma de comércio eletrônico. Ela deseja disponibilizar uma primeira versão com catálogo, carrinho e pagamento.


Release 1 — Descoberta e seleção de produtos

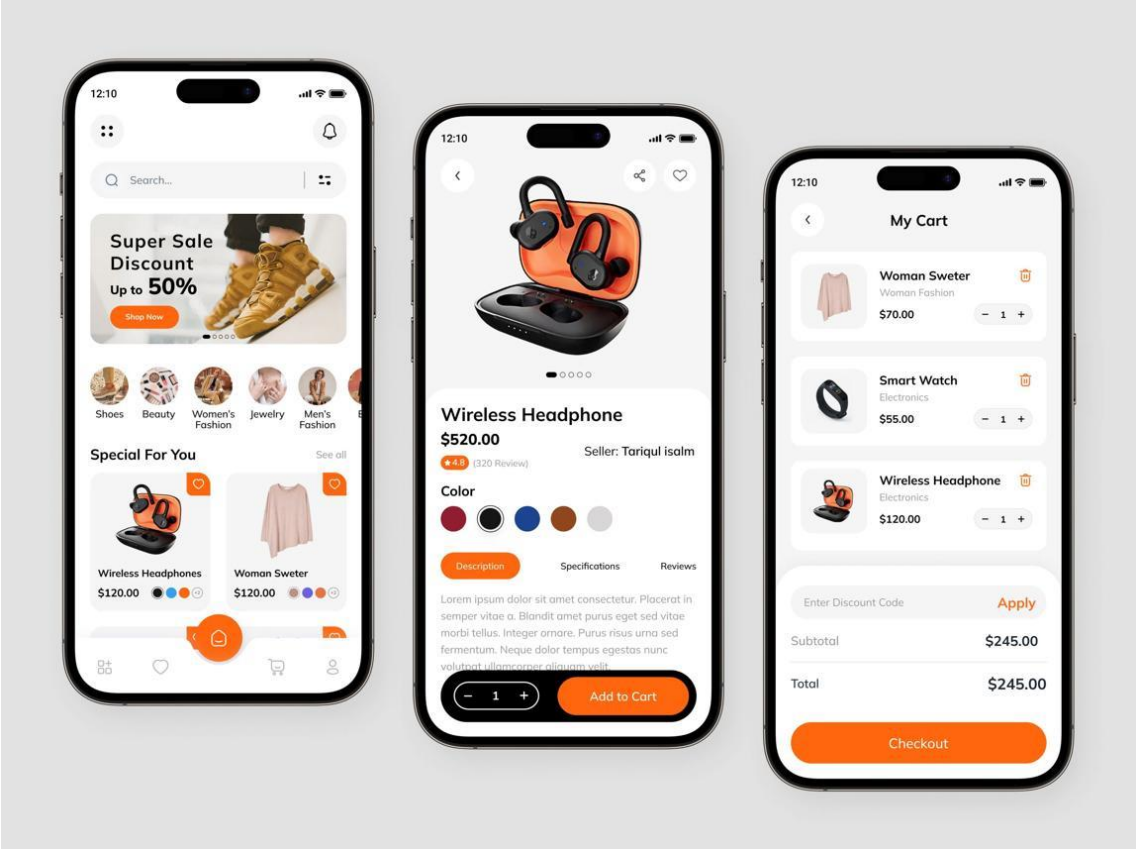

Objetivo: permitir que o cliente encontre produtos.

- Catálogo e detalhes dos produtos.
- Pesquisa e filtros.
- Testes de navegação e acessibilidade.


Release 2 — Preparação da compra

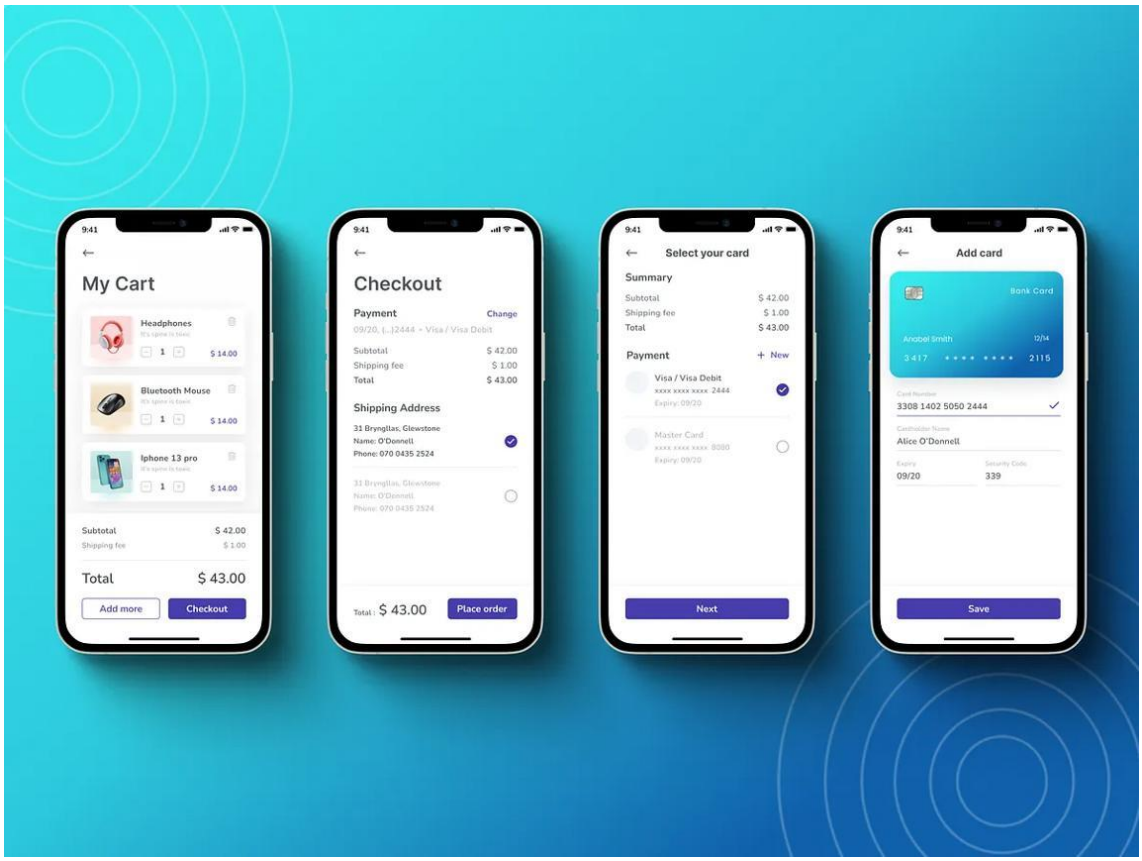

Objetivo: permitir que o cliente prepare seu pedido.

- Adição e remoção de produtos do carrinho.
- Atualização de quantidades.
- Cálculo do valor total e do frete.

Release 3 — Finalização do pedido

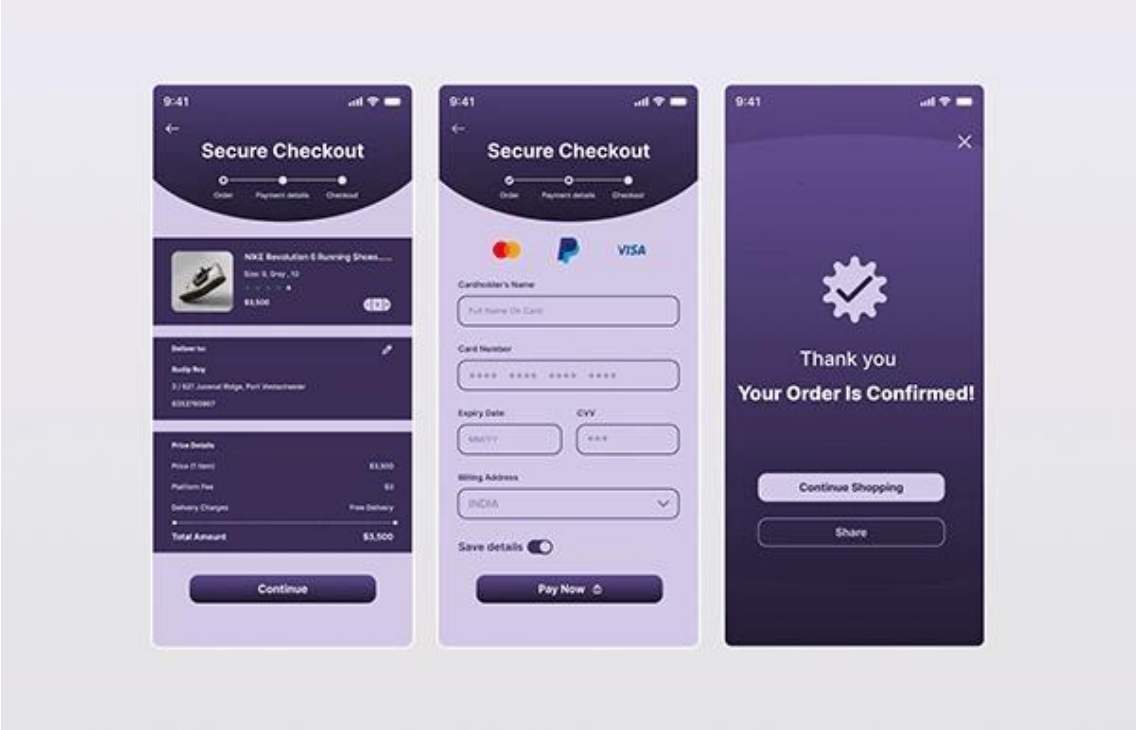

Objetivo: permitir que o cliente finalize a compra.

- Integração com o provedor de pagamento.
- Confirmação do pedido.
- Testes de segurança, falhas e recuperação.

Esse exemplo representa uma possível estratégia de evolução. Os itens e a divisão das releases devem ser adaptados à arquitetura, às necessidades dos usuários e aos riscos reais. Cada incremento produzido deve atender aos critérios de qualidade aplicáveis.

7.5. Velocidade e previsão de releases

A velocidade histórica pode ajudar a estimar quantas Sprints serão necessárias para concluir determinado conjunto de itens.

Suponha que:

- O backlog priorizado para a release tenha 110 Story Points.
- A velocidade média observada seja de 22 Story Points por Sprint.

Uma estimativa simplificada seria:

11022=5 Sprints22110=5 Sprints

Portanto, seriam aproximadamente cinco Sprints se o tamanho do backlog, a velocidade e as condições de trabalho permanecessem comparáveis.

Essa conta é apenas uma projeção pontual. Não considera variações da velocidade, mudanças de escopo, dependências ou incertezas. Para decisões importantes, é melhor trabalhar com cenários e intervalos de previsão.

7.6. Release não é necessariamente o fim de uma Sprint

Uma release pode ocorrer ao final de uma Sprint, no meio de uma Sprint ou de forma contínua, desde que os requisitos de qualidade e implantação sejam atendidos.

No Scrum, o Incremento deve estar utilizável e atender à Definition of Done. A decisão de disponibilizá-lo para usuários pode depender de estratégia comercial, riscos, controles operacionais ou outros critérios do produto.

Por isso, **concluir uma Sprint, concluir uma release e disponibilizar uma funcionalidade são acontecimentos relacionados, mas não necessariamente simultâneos**.

8. Diferenças entre Sprint Planning, Story Points, Planning Poker e Release Planning

Embora estejam relacionados, esses conceitos possuem finalidades diferentes.

Conceito	Principal finalidade	Horizonte
Sprint Planning	Definir o objetivo, o trabalho selecionado e o plano da Sprint.	Uma Sprint
Story Points	Estimar o tamanho relativo dos itens.	Item do backlog
Planning Poker	Facilitar a estimativa colaborativa dos itens.	Durante o refinamento ou planejamento
Planejamento de Sprint	Organizar a execução do trabalho durante a iteração.	Curto prazo
Release Planning	Planejar a evolução e a disponibilização de funcionalidades.	Várias Sprints ou um horizonte de produto

A relação entre eles pode ser resumida assim:

Objetivos do produto e prioridades

O que gera valor para o cliente?

Refinamento e estimativas

Story Points e Planning Poker

Sprint Planning

Sprint Goal, seleção de itens e plano de execução

Desenvolvimento e inspeção

Incrementos, feedback e melhoria contínua

Planejamento e evolução das releases

Disponibilização de valor e revisão das previsões

O fluxo não é totalmente linear. As informações obtidas durante uma Sprint podem alterar as prioridades do produto, as estimativas e o planejamento das releases futuras.

9. Exemplo integrado: aplicação dos conceitos em um único projeto

Imagine uma equipe responsável por criar um aplicativo de agendamento de consultas.

O objetivo do produto é permitir que pacientes encontrem profissionais, selecionem horários e realizem agendamentos.

Etapa 1 — Organizar o Product Backlog

O Product Owner prioriza as seguintes histórias:

História	Descrição	Story Points
US01	Consultar profissionais disponíveis	3
US02	Visualizar horários livres	3
US03	Agendar uma consulta	5
US04	Cancelar um agendamento	3
US05	Receber confirmação por e-mail	5

Os valores são ilustrativos e devem ser definidos pela equipe.

Etapa 2 — Aplicar Planning Poker

A equipe utiliza Planning Poker para estimar cada história.

Durante a discussão de US03, alguns participantes consideram o agendamento simples, enquanto outros identificam riscos relacionados à concorrência entre usuários que tentam reservar o mesmo horário.

A discussão revela a necessidade de esclarecer as regras de disponibilidade e evitar agendamentos duplicados. Depois desse esclarecimento, a equipe define a estimativa de 5 pontos.

Etapa 3 — Realizar o Sprint Planning

A equipe define o Sprint Goal:

Permitir que o paciente consulte profissionais e visualize horários disponíveis para atendimento.

Seleciona US01 e US02, totalizando 6 pontos.

Os Developers elaboram um plano inicial que inclui:

- Implementação da consulta de profissionais.
- Integração com os dados de disponibilidade.
- Testes de filtros e horários.
- Validação dos critérios de aceitação.

A seleção é coerente com o objetivo, desde que o trabalho possa ser concluído dentro da Sprint.

Etapa 4 — Executar a Sprint

Durante a Sprint, os Developers acompanham o progresso e atualizam o Sprint Backlog.

Ao descobrir que a integração com a agenda exige ajustes, a equipe adapta seu plano de execução. O objetivo continua sendo entregar uma maneira confiável de consultar profissionais e horários.

Ao final, a equipe inspeciona o incremento e verifica se os critérios de conclusão foram atendidos.

Etapa 5 — Planejar a release

Após a Sprint, o Product Owner considera os resultados e prioriza a capacidade de agendar consultas.

Uma possível sequência de entregas seria:

- Primeira entrega: consulta de profissionais e horários.
- Segunda entrega: agendamento e confirmação.
- Terceira entrega: cancelamento e melhorias de comunicação.

O plano é revisto à medida que as Sprints avançam. Caso surjam novas necessidades dos pacientes ou riscos técnicos, as prioridades podem mudar.

Esse exemplo mostra como estimativas, planejamento de Sprints e planejamento de releases se complementam para reduzir incertezas e entregar valor progressivamente.
